

東山墓園 第1期区域内
被災墓園の復旧に係る使用者説明会
(第3回)

平成30年 5月12日
午後2時～ 市役所大会議室

遺骨等引上げにかかる事前調査 実施状況

(4月末現在)


		平成29年度					30年度	累 計
		12月	1月	2月	3月	計	4月	
作業予定日(日)		5	20	28	31	84	30	114
作業実施日(日)		5	16	25	23	69	27	96
内訳	全日実施	4	12	24	22	62	24	86
	半日実施	1	4	1	1	7	3	10
従事者(延)(人)		39	172	330	341	882	241	1,123
内訳	シルバー人材センター	18	93	175	152	438	157	595
	市職員	21	66	134	124	345	71	416
	ボランティア		13	21	65	99	13	112
調査済区画数 (1×1m)		24	109	271	270	674	236	910
累 計		24	133	404	674	674	910	910
発見された遺骨等		13	35	98	106	252	72	324
内訳	遺骨片(袋)	13	19	47	48	127	20	147
	遺品・付属物等	0	16	51	58	125	52	177

事前調査作業状況（4月30日時点）


$\Sigma = 295 \text{区画} \times 16\text{m}^2 \text{平均} = 4720\text{m}^2$

4.0m × 4.0m



1メッシュ (4.0×4.0m)



メッシュ内分割 (2.0×2.0m)



Aを更に分割 (1.0×1.0m)

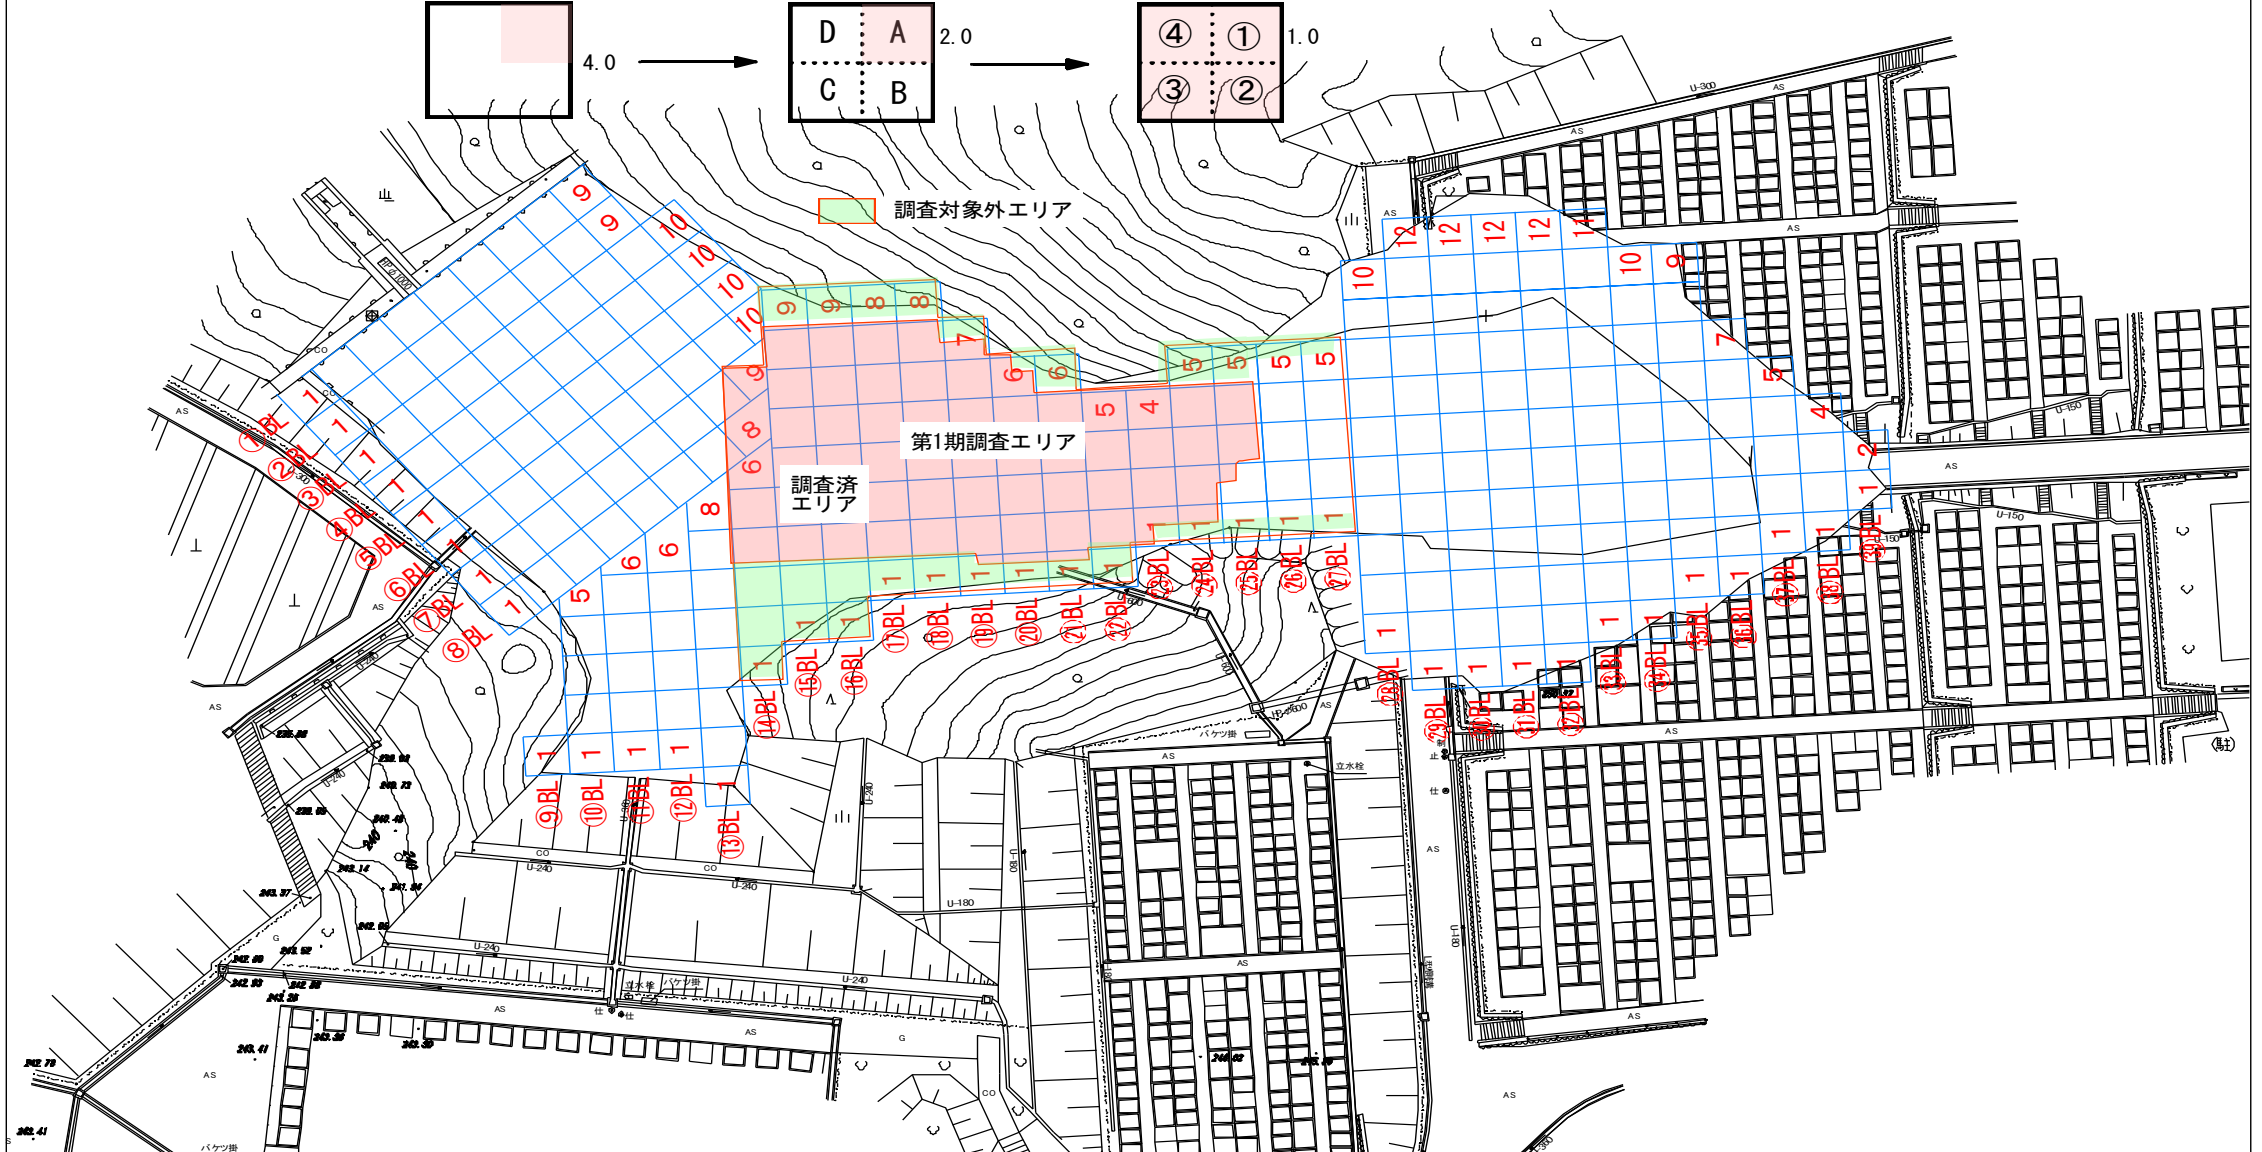

今後のスケジュールについて

- ・遺骨等の調査、引き上げ作業 平成29年12月～
- ・遺骨、墓石等のご確認 引き上げ後、随時
- ・暫定的な合同追悼所の設置 平成30年 2月～
- ・調整池流木撤去及び排水対策 平成30年 2月～
- ・墓園復旧工事 平成30年 9月～
(仮設道路、土砂搬出、園路復旧)
- ・復旧墓園の自然転圧 復旧工事完了後1年間
- ・新墓所整備 平成30年 7月～ 9月
- ・墓所の再建開始 平成30年10月～
- ・恒久的な合同追悼所の整備 復旧墓園の自然転圧後
