

東山墓園 第1期区域内 被災墓園の復旧にかかる使用者説明会（第4回）  
事 項 書

日時：令和元年5月25日（土）午前10時～

場所：名張市役所 1階 大会議室

1. あいさつ

2. 説明事項

1) 墓石、遺骨等の引き上げ状況について …… 資料1～5

2) 墓園復旧工事の概要について

3) 合同追悼所の構想について …… 資料6


3. 質疑応答

4. その他

## 復旧作業状況平面図（平成31年3月現在）

 $\Sigma = 295 \text{区画} \times 16 \text{m}^2 \text{平均} = 4720 \text{m}^2$ 

4.0m × 4.0m

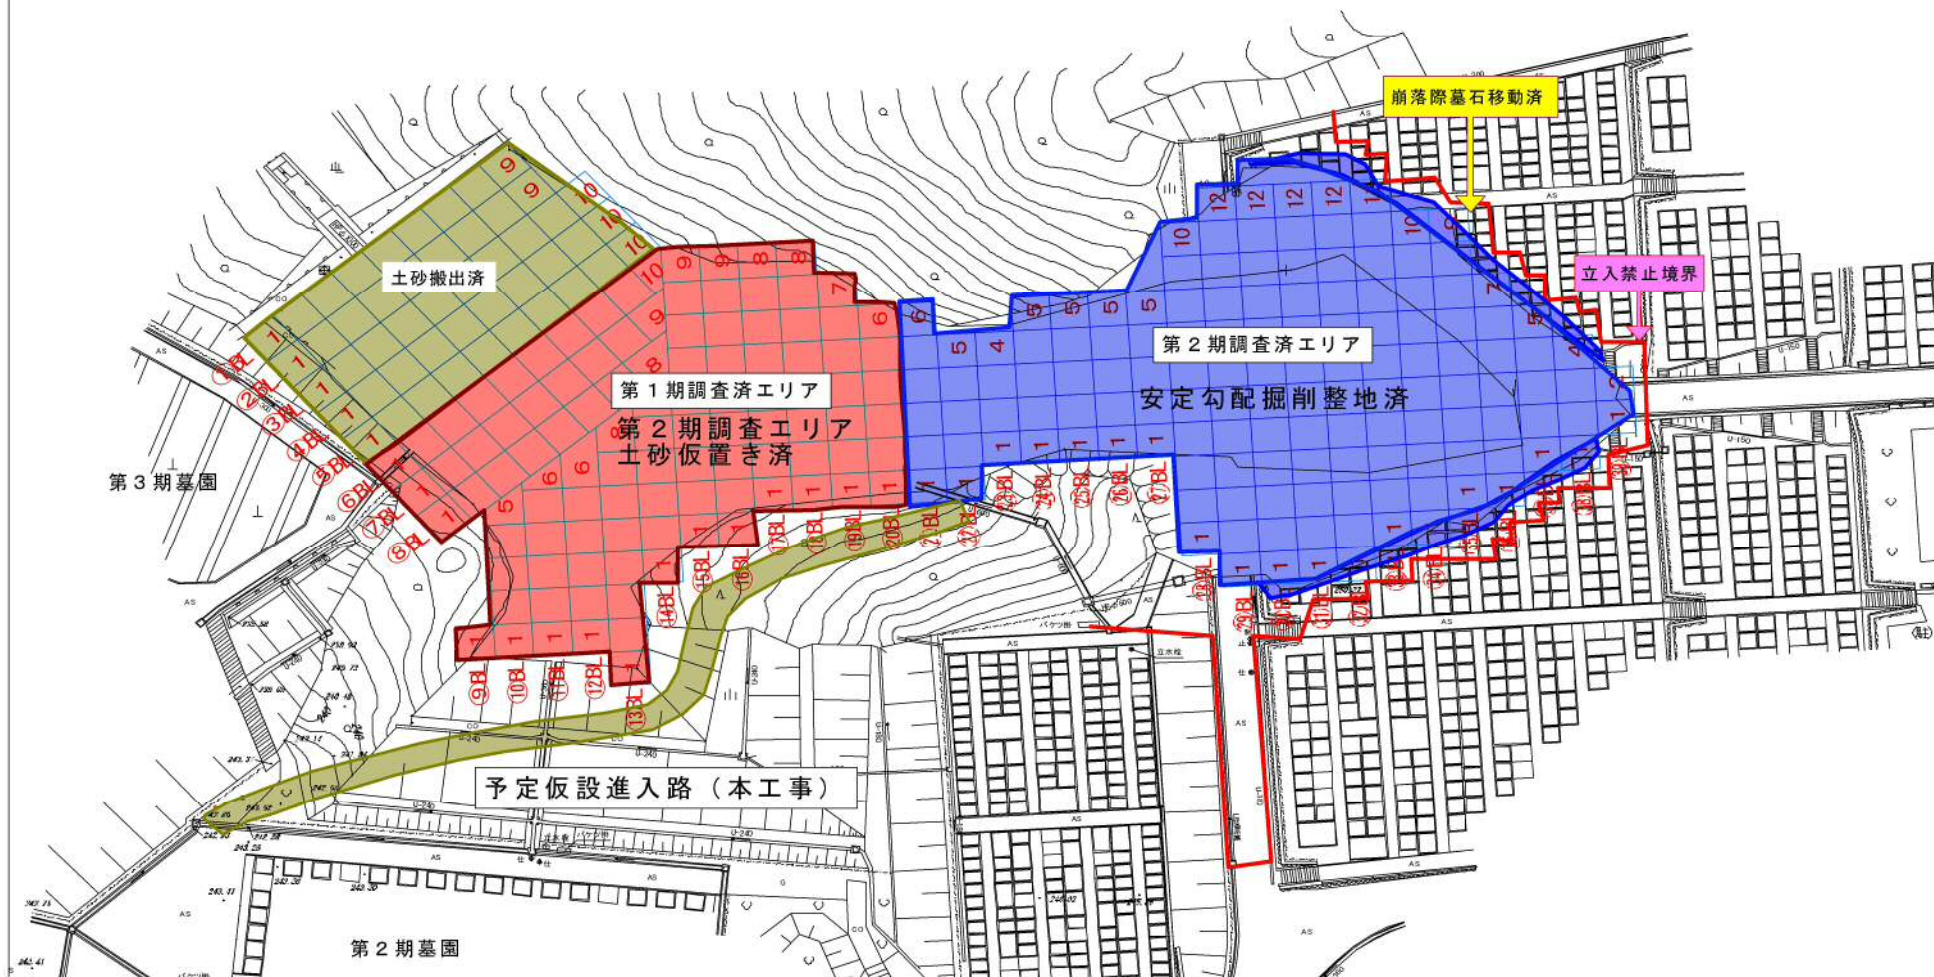

遺骨等引上げ作業 実施状況

(平成31年3月31日現在)

		第1期調査エリア (6BL~29BL)			第2期調査エリア(21BL~39BL)								累 計
		H29年度 12月~3月	H30年度 4月~8 月	計	H30年度								
					9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
作業予定日(日)		84	137	221	23	27	24	23	23	23	28	171	392
作業実施日(日)		69	109	178	10	22	16	20	21	21	27	137	315
内訳	全日実施	62	83	145	7	21	16	19	21	19	26	129	274
	半日実施	7	26	33	3	1	0	1	0	2	1	8	41
従事者(延人数)		882	978	1,860	51	209	116	144	69	67	56	712	2,572
内訳	シルバー人材センター	438	442	880	9	76	33	43	13	21	4	199	1,079
	市 職 員	345	503	848	42	132	83	101	56	46	52	512	1,360
	ボランティア	99	33	132	0	1	0	0	0	0	0	1	133
土木協力会	作業延人数		233	233	39	111	57	76	49	81	60	473	706
	車両出役台数		175	175	21	57	42	59	38	67	32	316	491
石材店	作業延人数		18	18	4	29	4	61	72	49	69	288	306
	車両出役台数		11	11	2	15	2	55	48	25	41	188	199
崩落際墓石 移転数/60 再建数/47	仮置済数							57	3	0	0	60	
	再建済数							0	8	8	31	47	
選別作業区画数(4m×4m) (H30年8月までは1m×1m)		674	936	1,610	7	47	24	12	19	11	0	120	
累 計		674	1,610		7	54	78	90	109	120	120		
発見された遺骨等		252	202	454	34	237	71	92	22	44	6	506	960
内訳	遺骨片(袋)	127	76	203	25	51	16	19	1	11	2	125	328
	遺品・付属物等	125	126	251	9	186	55	73	21	33	4	381	632

左記の内  
使用者個人特定状況

個人 判明数	個人 引取数
77	29
51	18
26	11

※H30年8月までの事前調査区画は1m×1m×0.3m(深さ)、H30年9月からの選別作業区画は4m×4m

※上記の数に、崩落  
際は含まない。

## 崩落箇所 墓石等引上げ状況一覧

崩落箇所
  未建立 22区画
  引上げ済
  引上げ済の内、  
 竿石引上げ済



H31年3月31日現在

全崩落 191区画  
 未建立 22区画  
 169区画

引上げ済み 120区画  
 引上げ率 71.0%

引上げ済件数  
 墓石 113件  
 水受け 1件  
 盃標 5件  
 銅板 1件  
 計 120件

墓石の内、竿石  
 109件  
 竿石引上げ率  
 64.5%

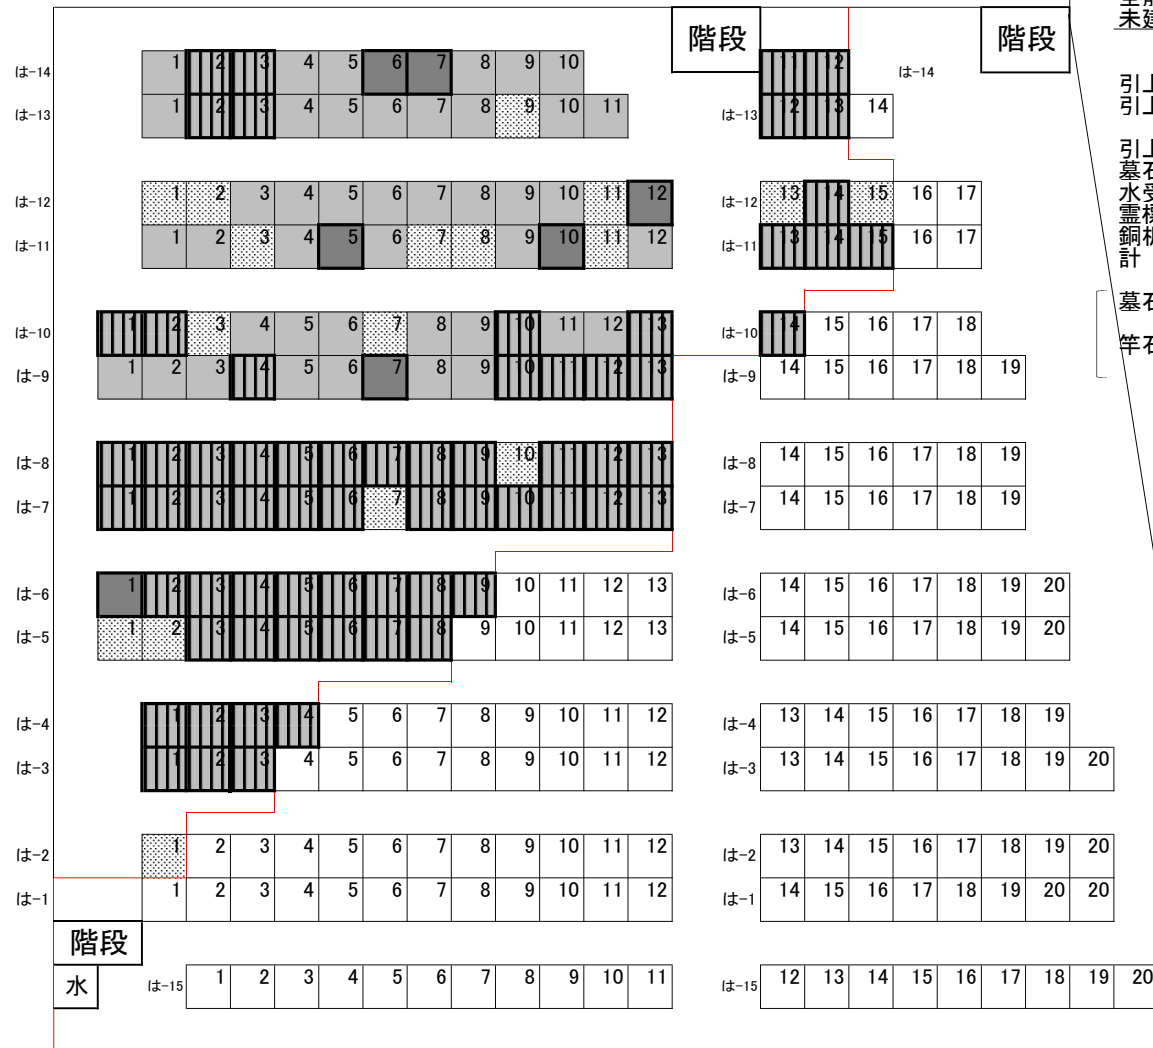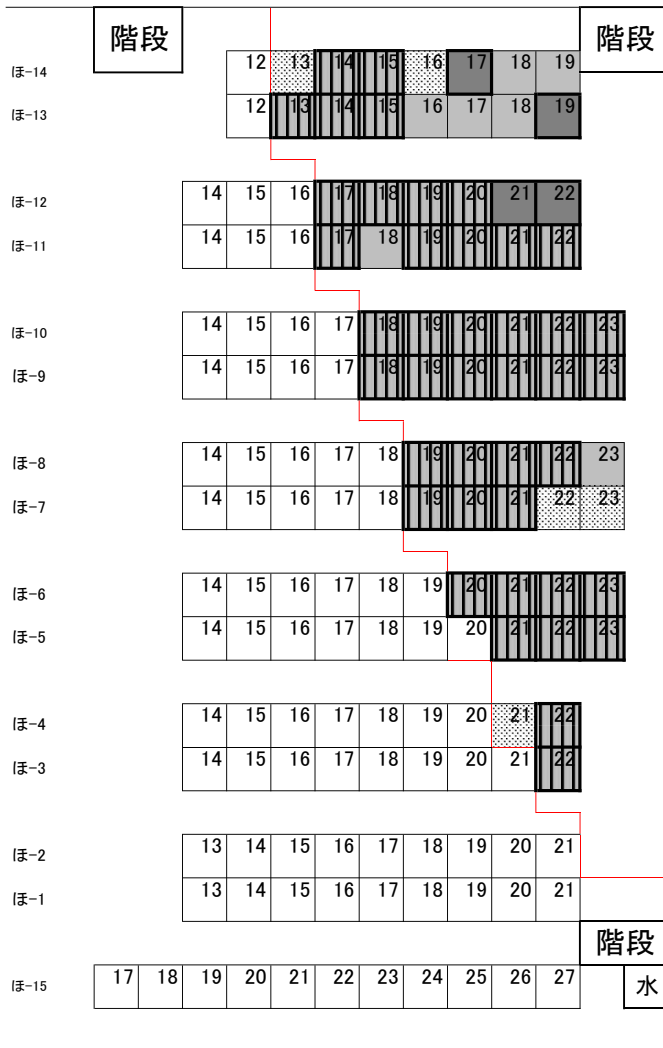


## 意向調査結果

平成31年4月26日現在

区 分		3㎡区画	4㎡区画	計	割合	備考
被災墓所	新 墓 所	90	46	136		
	他区画空墓所	1	1	2		
	返還(墓じまい)	38	11	49		
	未 回 答	1	0	1		
	計	130	58	188		
移転墓所 (崩落際)	新 墓 所	24	22	46		
	他区画空墓所	2	1	3		
	返還(墓じまい)	9	5	14		
	未 回 答	0	0	0		
	計	35	28	63		
計	新 墓 所	114	68	182	72.5%	
	他区画空墓所	3	2	5	2.0%	
	返還(墓じまい)	47	16	63	25.1%	
	未 回 答	1	0	1	0.4%	
	計	165	86	251	100.0%	

東山墓園第5期 新墓所再建状況図

2019.05.10現在

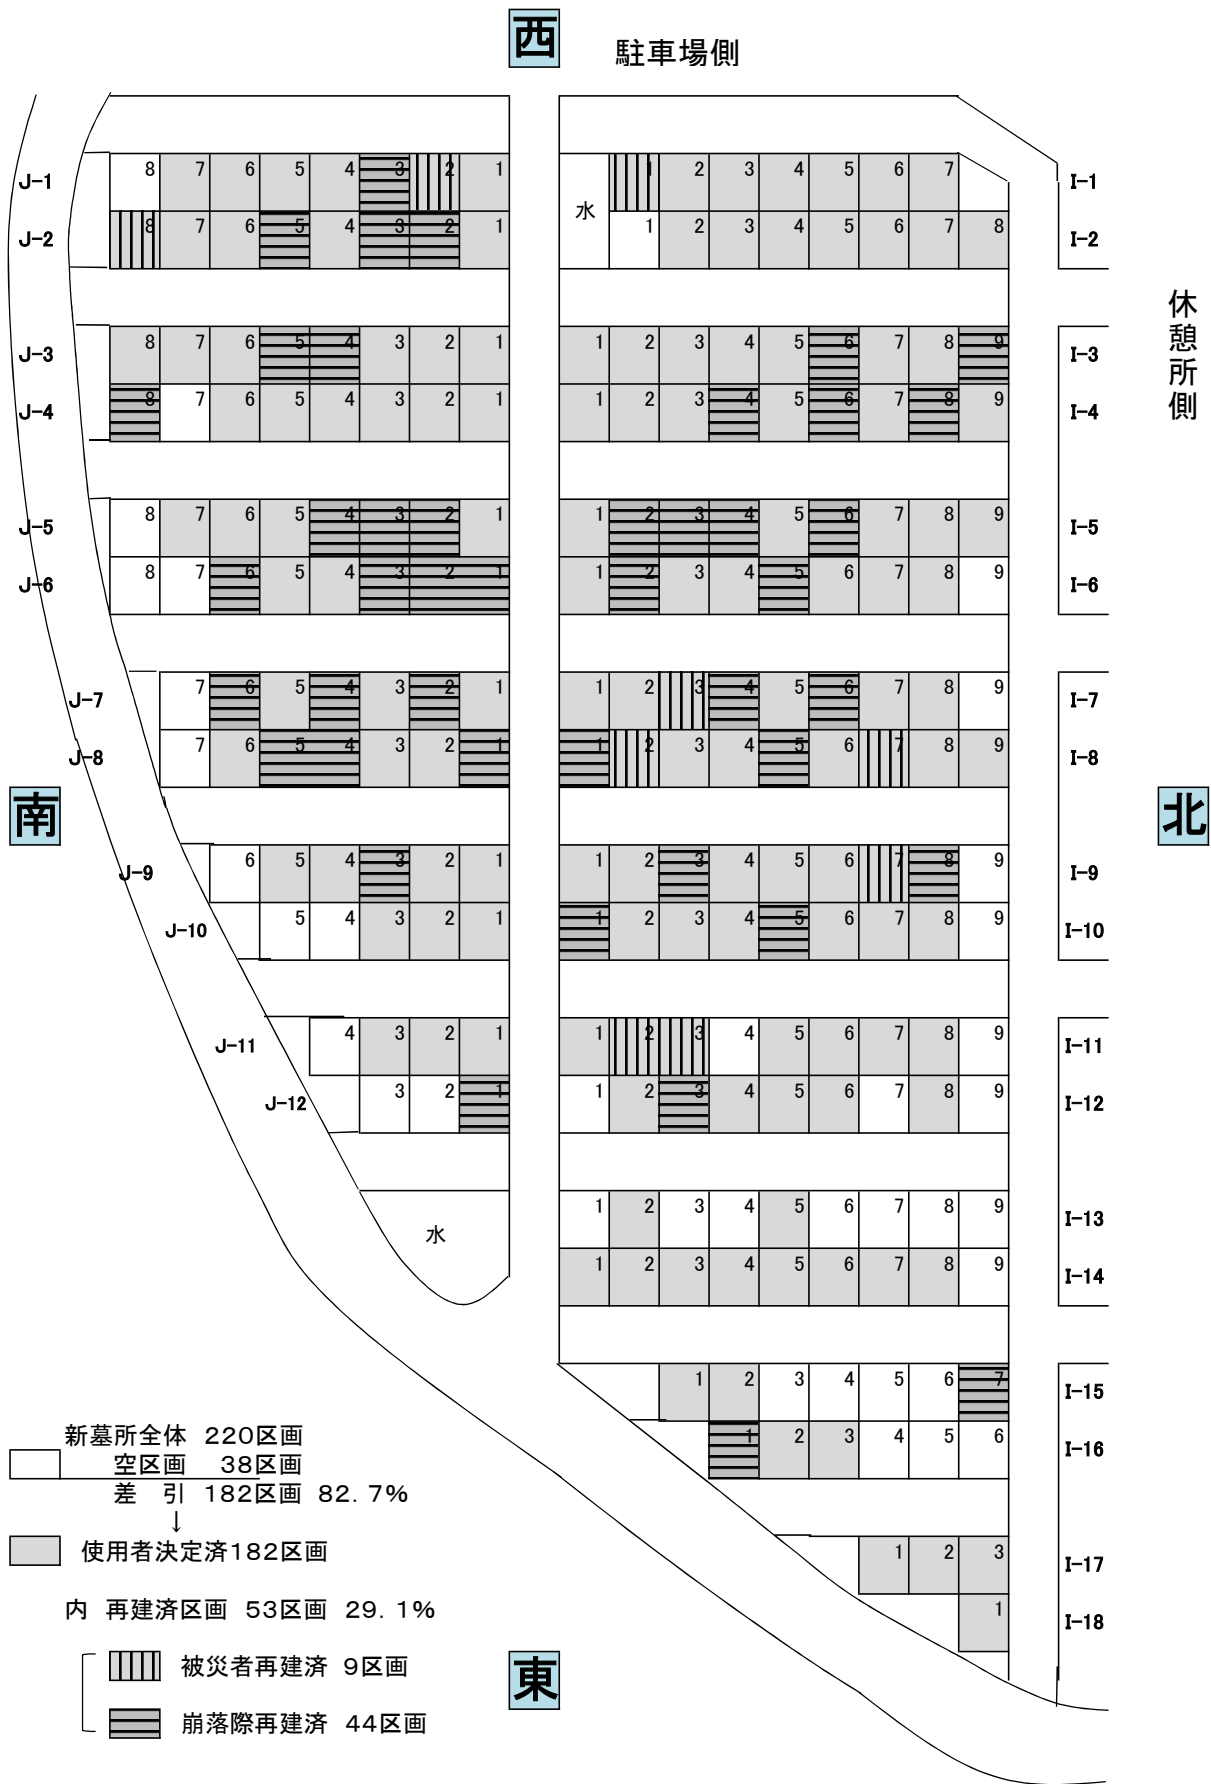

合同追悼所 イメージ図

